PLANNING DCE A2 MOTION

VERSION 1.01 en date du 03/01/2020

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1						
2		**000 ETAPES**	**269 jours**	**Lun 10/02/20**	**Lun 15/03/21**	
3		Début des travaux	0 jour	Lun 10/02/20	Lun 10/02/20	
4		Hors d'eau	0 jour	Ven 07/08/20	Ven 07/08/20	62
5		Hors d'air	0 jour	Mer 23/09/20	Mer 23/09/20	53
6		OPR	5 jours	Mar 12/01/21	Lun 18/01/21	85
7		Levée des réserves	40 jours	Mar 19/01/21	Lun 15/03/21	6
8		Fin des travaux	0 jour	Lun 15/03/21	Lun 15/03/21	7
9						
10		**001 TERRASSEMENTS**	**36 jours**	**Lun 10/02/20**	**Lun 30/03/20**	
11		Mise en place clôture et base vie provisoire	1 jour	Lun 10/02/20	Lun 10/02/20	30D
12		Terrassement et évacuation	5 jours	Lun 13/02/20	Ven 14/02/20	1100
13		Plateforme graves sous bureaux	15 jours	Lun 17/02/20	Ven 06/03/20	12
14		Plateforme graves sous parkings	10 jours	Lun 02/03/20	Ven 13/03/20	110D+10 jours
15		Essais de plaque	1 jour	Lun 16/03/20	Lun 16/03/20	14
16		Analyse + rapport essais de plaques	5 jours	Mar 17/03/20	Lun 23/03/20	15
17		DOE	5 jours	Mar 24/03/20	Lun 30/03/20	16
18						
19		**002 VRD**	**40 jours**	**Mer 02/09/20**	**Mar 27/10/20**	
20		Réseaux	20 jours	Mer 02/09/20	Mar 29/09/20	61,72
21		Bordures	15 jours	Mer 30/09/20	Mar 20/10/20	20
22		Enrobés et revêtements de surface	5 jours	Mer 21/10/20	Mar 27/10/20	21
23						
24		**003 GROS-OEUVRE**	**253 jours**	**Lun 16/03/20**	**Ven 26/03/21**	
25		Plans exécution	20 jours	Lun 15/02/21	Ven 12/03/21	1450D+10 jours;1340D+10 jou
26		Fabrication aciers	10 jours	Lun 15/03/21	Ven 26/03/21	250D+20 jours
27		Installation de chantier de l'entreprise	5 jours	Lun 16/03/20	Ven 20/03/20	14
28		Fondations et longrines	20 jours	Lun 23/03/20	Ven 17/04/20	27
29		Poteaux RDC	10 jours	Lun 13/04/20	Ven 24/04/20	28DD+15 jours
30		Voiles RDC	25 jours	Lun 13/04/20	Mer 19/05/20	29DD
31		Poutres RDC	10 jours	Lun 20/04/20	Lun 04/05/20	29DD+5 jours
32		Plancher haut RDC	20 jours	Mar 05/05/20	Mar 02/06/20	31DD+5 jours;30DD+15 jours
33		Voiles étages	15 jours	Mer 27/05/20	Mer 16/06/20	32DD+15 jours
34		Plancher collaborant sur RDC	5 jours	Mer 13/05/20	Mar 19/05/20	44
35		Plancher collaborant sur étage 1 (local technique)	3 jours	Mer 01/07/20	Ven 03/07/20	46
36						
37		**004 DALLAGE**	**20 jours**	**Lun 29/06/20**	**Ven 24/07/20**	
38		Préparation	5 jours	Lun 29/06/20	Ven 03/07/20	67
39		Dallages RDC	5 jours	Lun 06/07/20	Ven 10/07/20	38
40		Séchage avant roulage nacelles	10 jours	Lun 13/07/20	Ven 24/07/20	39
41						
42		**005 CHARPENTE METAL**	**50 jours**	**Lun 20/04/20**	**Mar 30/06/20**	
43		Charpente métal RDC	15 jours	Lun 20/04/20	Mar 12/05/20	28
44		Bac collaborant pl. haut RDC	5 jours	Mar 05/05/20	Mar 12/05/20	43DD+10 jours
45		Charpente métal étage 1 et LT	10 jours	Mer 17/06/20	Mar 30/06/20	33
46		Bac collaborant pl. haut étage 1 (LT)	2 jours	Lun 29/06/20	Mar 30/06/20	45DD+8 jours
47						
48		**006 MENUISERIES EXT. / OCCULTATIONS**	**140 jours**	**Lun 13/07/20**	**Ven 12/02/21**	
49		Transmission réservations lot Gros-Œuvre et Charpente	10 jours	Lun 01/02/21	Ven 12/02/21	
50		Chassis dans façades beton RDC	8 jours	Lun 13/07/20	Mer 22/07/20	39;32FD+20 jours
51		Chassis dans façade métal RDC	7 jours	Jeu 23/07/20	Ven 31/07/20	67;50
52		Chassis dans façade métal étage	8 jours	Lun 03/08/20	Mer 12/09/20	51;69
53		Murs rideaux	15 jours	Jeu 03/09/20	Mer 23/09/20	52
54		Occultations	10 jours	Lun 02/11/20	Ven 13/11/20	184DD
55						
56		**007 COUVERTURE / ETANCHEITE**	**78 jours**	**Lun 01/06/20**	**Mer 07/10/20**	
57		Isolant + étanchéité plancher haut du RDC	15 jours	Lun 01/06/20	Ven 19/06/20	34FD+8 jours
58		Relevés et finitions plancher haut RDC	10 jours	Lun 22/06/20	Ven 03/07/20	57
59		Bac + isolant + étanchéité plancher haut étage 1	15 jours	Mer 01/07/20	Mar 21/07/20	45
60		Relevés et finitions plancher haut étage 1	8 jours	Mer 22/07/20	Ven 31/07/20	59
61		Bac + isolant + étanchéité plancher haut étage 2	8 jours	Mer 22/07/20	Ven 31/07/20	59
62		Relevés et finitions plancher haut étage 2	5 jours	Lun 03/08/20	Ven 07/08/20	61
63		Dalettes sur plots	5 jours	Jeu 24/09/20	Mer 30/09/20	53
64		Végétalisation	5 jours	Jeu 01/10/20	Mer 07/10/20	63
65						
66		**008 BARDAGE**	**57 jours**	**Lun 22/06/20**	**Mar 29/09/20**	
67		Plateau bardages double peau en RDC	5 jours	Lun 22/06/20	Ven 26/06/20	57
68		Isolant + pseu extérieure bardages OP RDC	15 jours	Lun 29/06/20	Ven 17/07/20	67
69		Plateau bardages cassettes	5 jours	Mer 22/07/20	Mar 28/07/20	59
70		Isolant + pseu extérieure bardages cassettes	15 jours	Mer 29/07/20	Mar 18/08/20	69
71		Plateau bardages composite	5 jours	Mer 22/07/20	Mar 28/07/20	59
72		Isolant + pseu extérieure bardages composite	10 jours	Mer 29/07/20	Mar 11/09/20	71
73		Habillages et finitions	20 jours	Mer 02/09/20	Mar 29/09/20	72
74						
75		**009 MENUISERIES INT. BOIS**	**93 jours**	**Lun 31/08/20**	**Mer 06/01/21**	
76		Approvisionnement huisseries portes	1 jour	Lun 31/08/20	Lun 31/08/20	4
77		Habillages intérieurs divers / plinthes	20 jours	Lun 02/11/20	Ven 27/11/20	168
78		Pose + équipement portes stratifiées	10 jours	Jeu 24/12/20	Mer 06/01/21	84DD
79						
80		**010 DOUBLAGES ET CLOISONS DEMONTABLES**	**96 jours**	**Lun 31/08/20**	**Lun 11/01/21**	
81		Doublages démontables RDC	12 jours	Lun 31/08/20	Mar 15/09/20	5D;4
82		Doublages démontables étage	10 jours	Mer 16/09/20	Mar 29/09/20	81;52D+5 jours
83		Cloisons démontables RDC	15 jours	Jeu 26/11/20	Mer 16/12/20	175
84		Cloisons démontables étage	10 jours	Jeu 24/12/20	Mer 06/01/21	181
85		Portes dans cloisons démontables	3 jours	Jeu 07/01/21	Lun 11/01/21	84
86						
87		**011 CLOISONS / PLAFONDS SALLE BLANCHE**	**75 jours**	**Lun 13/07/20**	**Ven 13/11/20**	
88		Doublages salles blanches	10 jours	Lun 13/07/20	Ven 24/07/20	39
89		Cloisons salles blanches	10 jours	Lun 27/07/20	Ven 07/08/20	88
90		Ossature plafonds salles blanches	10 jours	Lun 28/09/20	Ven 09/10/20	146;148
91		Plaquage plafonds salles blanches	10 jours	Lun 02/11/20	Ven 13/11/20	155
92						
93		**012 PLATRERIE / FAUX-PLAFONDS**	**70 jours**	**Lun 31/08/20**	**Ven 04/12/20**	
94		Cloisons fixes RDC	15 jours	Lun 31/08/20	Ven 18/09/20	4;50
95		Cloisons fixes étage	10 jours	Lun 21/09/20	Ven 02/10/20	94
96		Ossature FP RDC	10 jours	Lun 05/10/20	Ven 16/10/20	106;122;146;149
97		Ossature FP étage	10 jours	Lun 02/11/20	Ven 13/11/20	108;124;150;153
98		Plaquage FP RDC	5 jours	Lun 02/11/20	Ven 06/11/20	155
99		Plaquage FP étage	5 jours	Lun 30/11/20	Ven 04/12/20	156
100						
101		**014 ELECTRICITE Cfo / CFa**	**238 jours**	**Lun 23/03/20**	**Ven 12/02/21**	
102		Plans exécution	30 jours	Lun 01/02/21	Ven 12/03/21	
103		Transmission réservations lot Gros-Œuvre	10 jours	Lun 01/02/21	Ven 12/02/21	102DD
104		Mise à la terre	15 jours	Lun 23/03/20	Ven 10/04/20	28DD
105		Réseaux et chemins de câble RDC	20 jours	Lun 27/07/20	Ven 11/09/20	40
106		Câblage RDC	15 jours	Lun 31/08/20	Ven 18/09/20	105DD+10 jours
107		Réseaux et chemins de câble étage	15 jours	Lun 14/09/20	Ven 02/10/20	105
108		Câblage étage	10 jours	Lun 28/09/20	Ven 09/10/20	107DD+10 jours
109		Armoires et tableaux de protections	30 jours	Lun 21/09/20	Ven 30/10/20	106
110		Appareillage vertical RDC	10 jours	Lun 21/09/20	Ven 02/10/20	106
111		Luminaires RDC	10 jours	Lun 19/10/20	Ven 30/10/20	96
112		Appareillage vertical étage	10 jours	Lun 12/10/20	Ven 23/10/20	108
113		Luminaires étage	10 jours	Lun 16/11/20	Ven 27/11/20	97
114		Etiquetage / plaques de propreté	5 jours	Lun 16/11/20	Ven 20/11/20	113DD
115		Consuel	5 jours	Lun 16/11/20	Ven 20/11/20	114DD
116		Autocontrôles / essais / mises en service	40 jours	Lun 30/11/20	Ven 22/01/21	113
117						
118		**015 SECURITE**	**135 jours**	**Lun 27/07/20**	**Ven 19/02/21**	
119		Plans exécution	15 jours	Lun 01/02/21	Ven 19/02/21	
120		Transmission réservations lot Gros-Œuvre	5 jours	Lun 01/02/21	Ven 05/02/21	119DD
121		Réseaux et chemins de câble RDC	20 jours	Lun 27/07/20	Ven 11/09/20	40
122		Câblage RDC	15 jours	Lun 31/08/20	Ven 18/09/20	121DD+10 jours
123		Réseaux et chemins de câble étage	10 jours	Lun 14/09/20	Ven 25/09/20	107DD
124		Câblage étage	10 jours	Mer 23/09/20	Mar 06/10/20	123DD+7 jours
125		Baie de brassage / centrale	30 jours	Mer 07/10/20	Mar 17/11/20	124
126		Appareillage vertical RDC	10 jours	Lun 21/09/20	Ven 02/10/20	122
127		Appareillage en plafond RDC	10 jours	Lun 12/10/20	Ven 23/10/20	108
128		Appareillage vertical étage	10 jours	Mer 07/10/20	Mar 20/10/20	124
129		Appareillage en plafonds étage	10 jours	Lun 07/12/20	Ven 18/12/20	99
130		Autocontrôles / essais / mises en service	20 jours	Lun 21/12/20	Ven 15/01/21	129
131						
132		**016 PLOMBERIE**	**125 jours**	**Lun 31/08/20**	**Ven 19/02/21**	
133		Plans exécution	15 jours	Lun 01/02/21	Ven 19/02/21	
134		Transmission réservations lot Gros-Œuvre	5 jours	Lun 01/02/21	Ven 05/02/21	133DD
135		Alimentations et évacuations RDC	10 jours	Lun 31/08/20	Ven 11/09/20	94DD
136		Alimentations et évacuations étage	8 jours	Lun 21/09/20	Mer 30/09/20	95DD
137		Appareillage RDC	5 jours	Lun 09/11/20	Ven 13/11/20	168;98
138		Appareillage étage	5 jours	Lun 30/11/20	Ven 04/12/20	170;156
139		Robinetterie	3 jours	Lun 07/12/20	Mer 09/12/20	138
140		Essais et mise en service	15 jours	Mer 09/12/20	Mar 29/12/20	139
141		Désinfection des réseaux	5 jours	Mer 30/12/20	Mar 05/01/21	140
142						
143		**017 TRAITEMENT D'AIR**	**150 jours**	**Lun 27/07/20**	**Ven 12/03/21**	
144		Plans exécution	30 jours	Lun 01/02/21	Ven 12/03/21	
145		Transmission réservations lot Gros-Œuvre	15 jours	Lun 01/02/21	Ven 19/02/21	144DD
146		Supportage + réseaux hydrauliques RDC	30 jours	Lun 27/07/20	Ven 25/09/20	40
147		Calorifuge sur réseaux hydrauliques RDC	15 jours	Lun 14/09/20	Ven 02/10/20	146DD+20 jours
148		Réseaux aérolignes RDC	30 jours	Lun 27/07/20	Ven 25/09/20	40
149		Calorifuge sur réseaux aérolignes RDC	15 jours	Lun 14/09/20	Ven 02/10/20	148DD+20 jours
150		Supportage + réseaux hydrauliques étage	20 jours	Lun 28/09/20	Ven 23/10/20	146
151		Calorifuge sur réseaux hydrauliques étage	10 jours	Lun 19/10/20	Ven 30/10/20	150DD+15 jours
152		Réseaux aérolignes étage	20 jours	Lun 28/09/20	Ven 23/10/20	148
153		Calorifuge sur réseaux aérolignes étage	10 jours	Lun 19/10/20	Ven 30/10/20	152DD+15 jours
154		Production et CTA dans LT	30 jours	Lun 12/10/20	Ven 20/11/20	150DD+10 jours
155		Equipement en plafonds RDC	10 jours	Lun 19/10/20	Ven 30/10/20	96
156		Equipement en plafonds étage	10 jours	Lun 16/11/20	Ven 27/11/20	97
157		Essais et mise en service	40 jours	Lun 23/11/20	Ven 15/01/21	154
158						
159		**018 FLUIDES TECHNIQUES**	**125 jours**	**Lun 31/08/20**	**Ven 19/02/21**	
160		Plans exécution	15 jours	Lun 01/02/21	Ven 19/02/21	
161		Transmission réservations lot Gros-Œuvre	5 jours	Lun 01/02/21	Ven 05/02/21	160DD
162		Réseaux	15 jours	Lun 31/08/20	Ven 18/09/20	146DD+10 jours
163		Vannes / étiquetage / finitions	10 jours	Lun 21/09/20	Ven 02/10/20	162
164		Essais et mise en service	20 jours	Lun 05/10/20	Ven 30/10/20	163
165						
166		**019 CARRELAGES**	**50 jours**	**Lun 21/09/20**	**Ven 27/11/20**	
167		Carrelages au sol RDC + plinthes	15 jours	Lun 21/09/20	Ven 09/10/20	94
168		Carrelages muraux RDC	15 jours	Lun 12/10/20	Ven 30/10/20	167
169		Carrelages au sol étage + plinthes	15 jours	Lun 05/10/20	Ven 23/10/20	95
170		Carrelages muraux étage	15 jours	Lun 26/10/20	Ven 13/11/20	169
171		Carrelages escalier	10 jours	Lun 16/11/20	Ven 27/11/20	170
172						
173		**020 SOLS SOUPLES**	**33 jours**	**Lun 09/11/20**	**Mar 22/12/20**	
174		Ragréage zone logistique RDC	3 jours	Lun 09/11/20	Mer 11/11/20	98
175		Sols souples ESD zone logistique RDC	10 jours	Jeu 12/11/20	Mer 25/11/20	174
176		Couche interposition RDC	2 jours	Lun 16/11/20	Mar 17/11/20	91
177		Ragréage zone SB RDC	3 jours	Jeu 26/11/20	Lun 30/11/20	175
178		Sols souples ESD zone SB RDC	10 jours	Mar 01/12/20	Lun 14/12/20	177
179		Ragréages étage	3 jours	Lun 07/12/20	Mer 09/12/20	99
180		Sols souple détente étage	2 jours	Jeu 10/12/20	Ven 11/12/20	179
181		Moquette étage	8 jours	Lun 14/12/20	Mar 22/12/20	180
182						
183		**021 PEINTURES**	**56 jours**	**Lun 02/11/20**	**Lun 18/01/21**	
184		Peintures sur cloisons placo et huiseries RDC	10 jours	Lun 02/11/20	Ven 13/11/20	98DD
185		Peintures sur cloisons placo et huiseries étage	10 jours	Lun 30/11/20	Ven 11/12/20	99DD
186		Nettoyage fin de chantier	5 jours	Mar 12/01/21	Lun 18/01/21	85
187						
188		**022 SERRURERIE**	**140 jours**	**Lun 13/07/20**	**Ven 12/02/21**	
189		Transmission réservations lot Gros-Œuvre et Charpente	10 jours	Lun 01/02/21	Ven 12/02/21	
190		Portes de secours	10 jours	Lun 13/07/20	Ven 24/07/20	50DD
191		Garde-corps	10 jours	Lun 30/11/20	Ven 11/12/20	171
192		Grilles et ouvrages divers	30 jours	Lun 14/12/20	Ven 25/12/20	191
193						
194		**023 PORTES INDUSTR. / NIV. DE QUAI**	**140 jours**	**Lun 13/07/20**	**Ven 12/02/21**	
195		Transmission réservations lot Gros-Œuvre et Charpente	10 jours	Lun 01/02/21	Ven 12/02/21	
196		Portes industrielles	5 jours	Lun 13/07/20	Ven 17/07/20	50DD
197		Niveleur de quai	5 jours	Jeu 24/12/20	Mer 30/12/20	8400
198		Accessoires	2 jours	Jeu 31/12/20	Ven 01/01/21	197
199						
200		**024 PORTES AUTOMATIQUES**	**5 jours**	**Jeu 24/09/20**	**Mer 30/09/20**	
201		Portes automatiques	5 jours	Jeu 24/09/20	Mer 30/09/20	53
202						
203		**025 CLOTURES / PORTAILS**	**25 jours**	**Mer 21/10/20**	**Mar 24/11/20**	
204		Clôtures	15 jours	Mer 21/10/20	Mar 10/11/20	21
205		Portails	5 jours	Mer 11/11/20	Mar 17/11/20	204
206		Essais et mise en service	5 jours	Mer 18/11/20	Mar 24/11/20	205
207						
208		**026 ESPACES VERTS**	**88 jours**	**Mer 11/11/20**	**Ven 12/03/21**	
209		Remise en forme terre végétale	5 jours	Mer 11/11/20	Mar 17/11/20	204
210		Plantations	10 jours	Mer 18/11/20	Mar 01/12/20	209
211		Engazonnement	10 jours	Lun 01/03/21	Ven 12/03/21	
212						
213		**027 ASCENSEURS**	**80 jours**	**Jeu 24/09/20**	**Mer 13/01/21**	
214		Installation ascenseur	15 jours	Jeu 24/09/20	Mer 14/10/20	5
215		Mise en service définitive	5 jours	Jeu 07/01/21	Mer 13/01/21	85DD

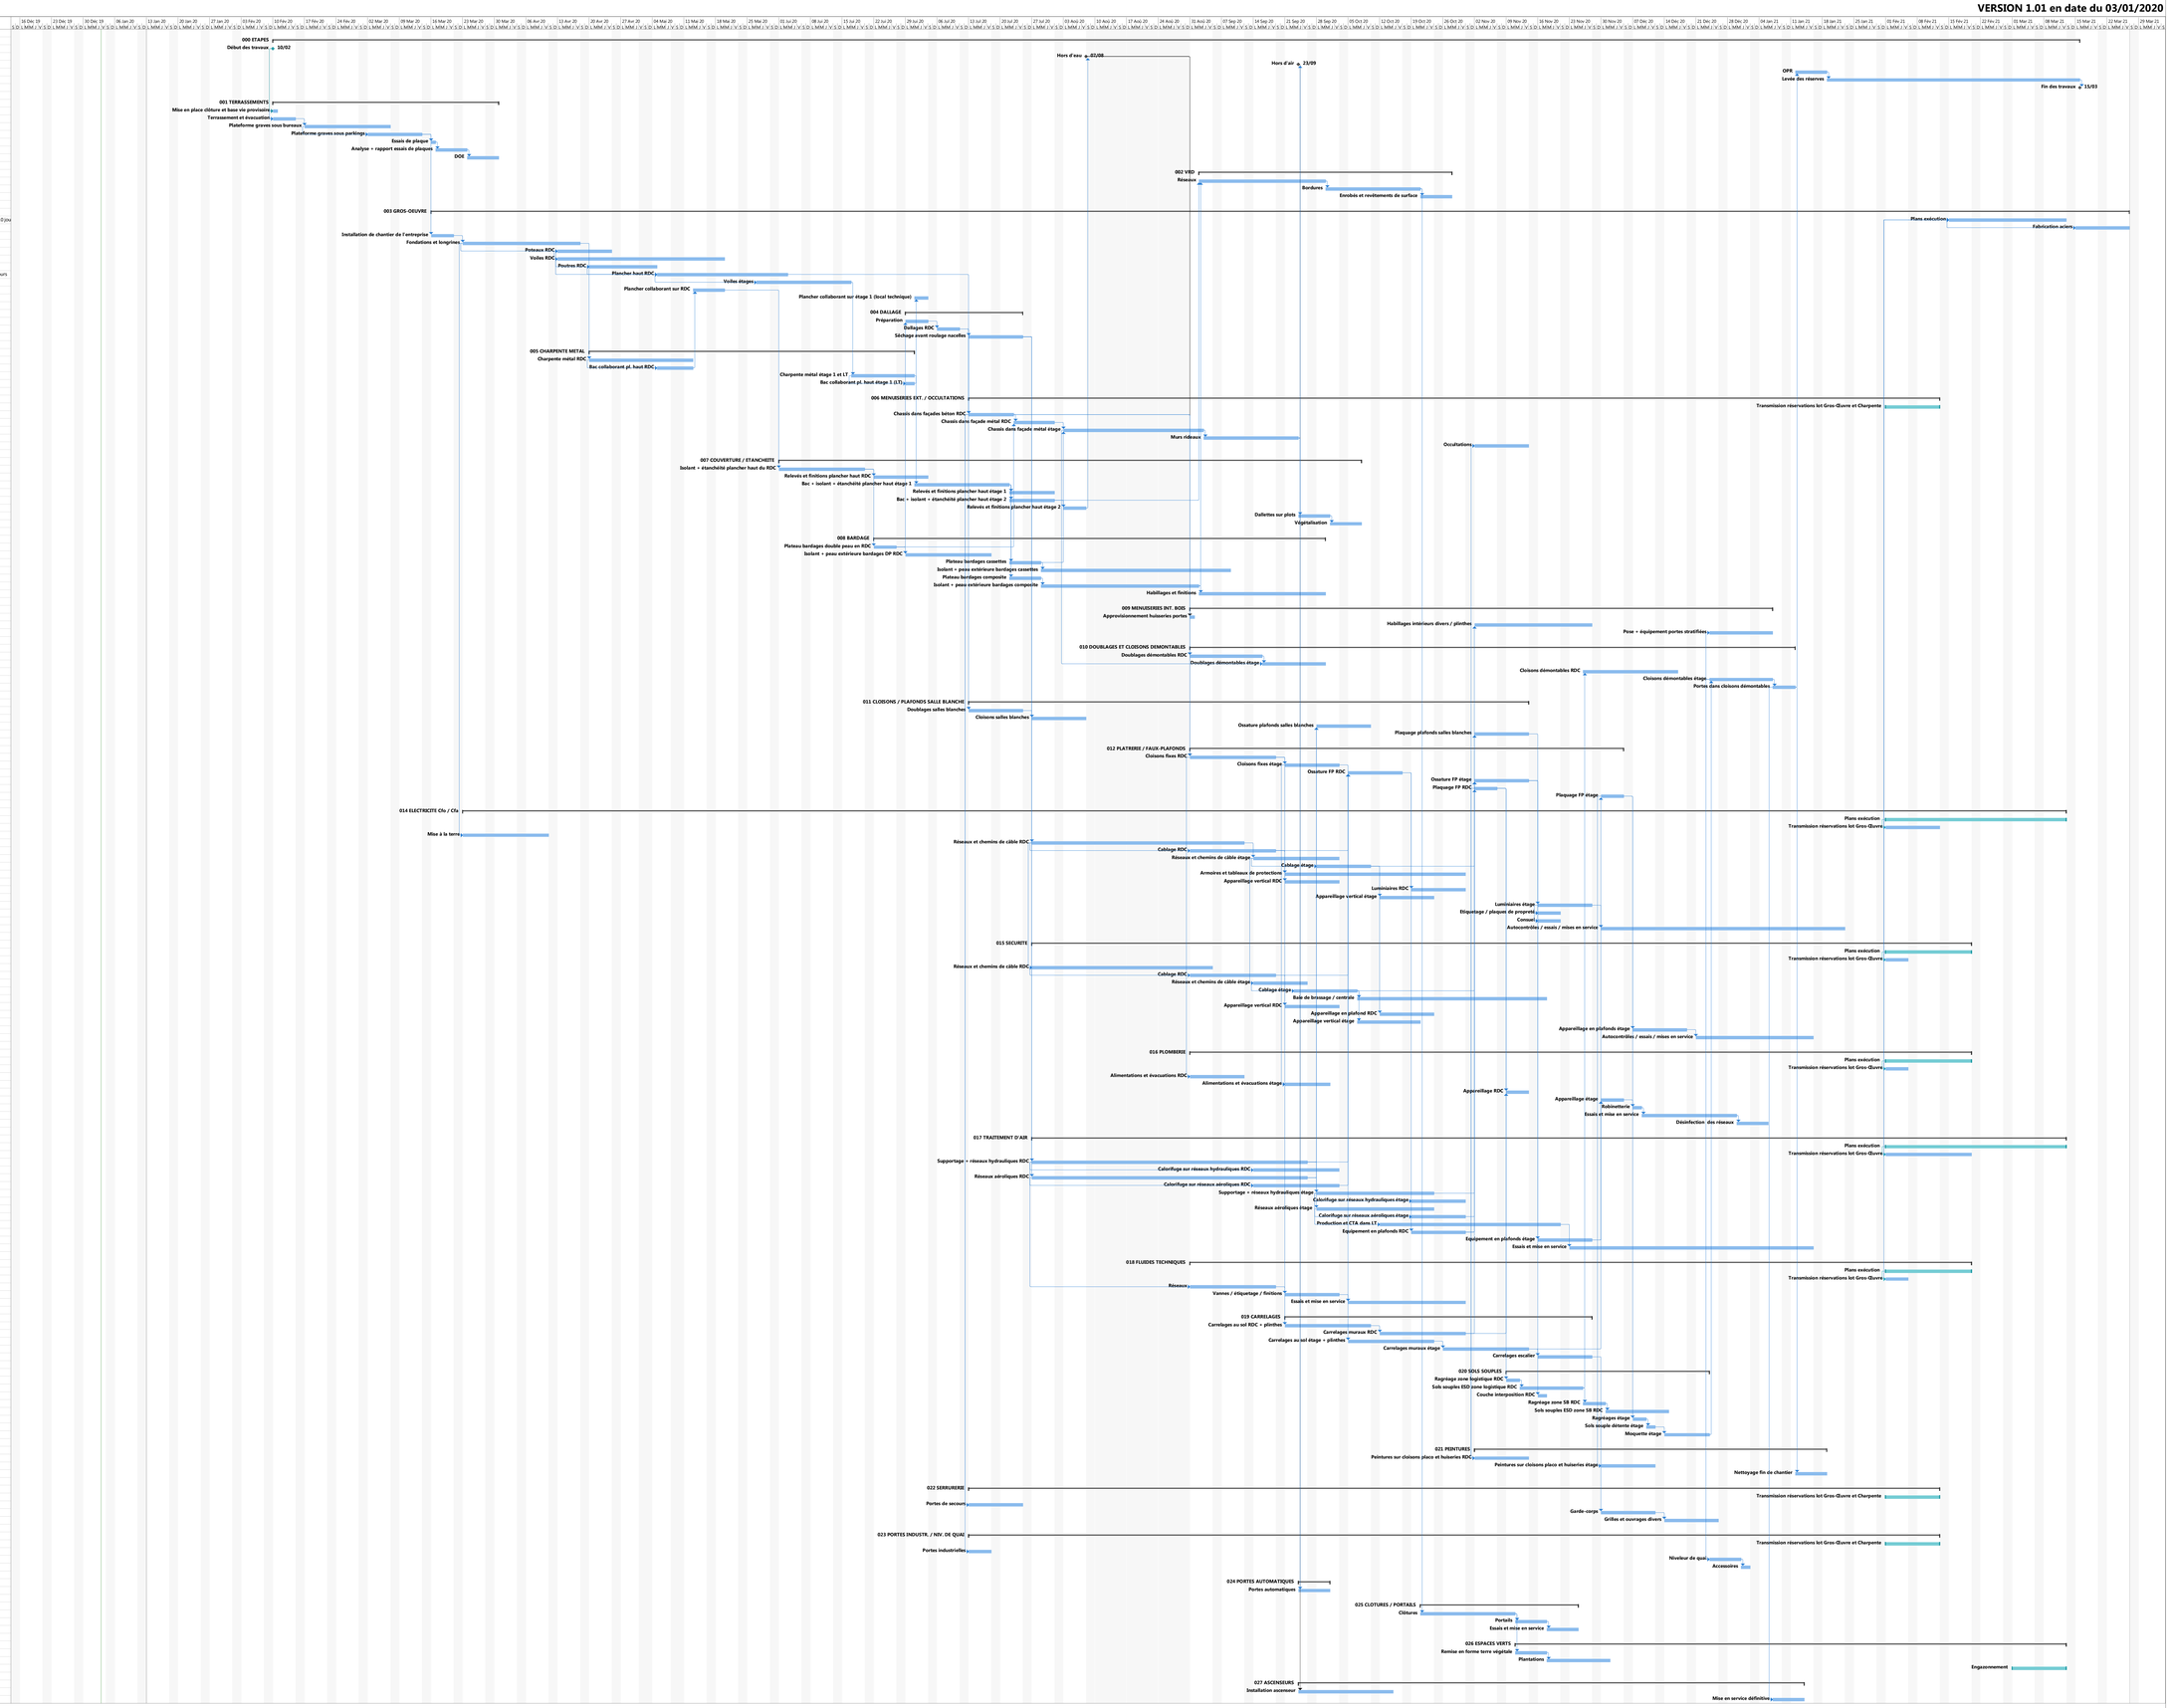

Projet : Planning DCE
Date : Ven 01/01/20

Tâche — Fractionnement — Jalon — Récapitulative — Récapitulatif du projet — Tâche inactive — Jalon inactif — Récapitulatif inactif — Tâche manuelle — Durée uniquement — Report récapitulatif manuel — Récapitulatif manuel — Début uniquement — Fin uniquement — Tâches externes — Jalons externes — Échéance — Avancement — Progression manuelle
